


Prosjekt- og porteføljeverktøy


Deling og samhandling i praksis




Ole-Kristian Tangen
Utviklingssjef Asker kommune

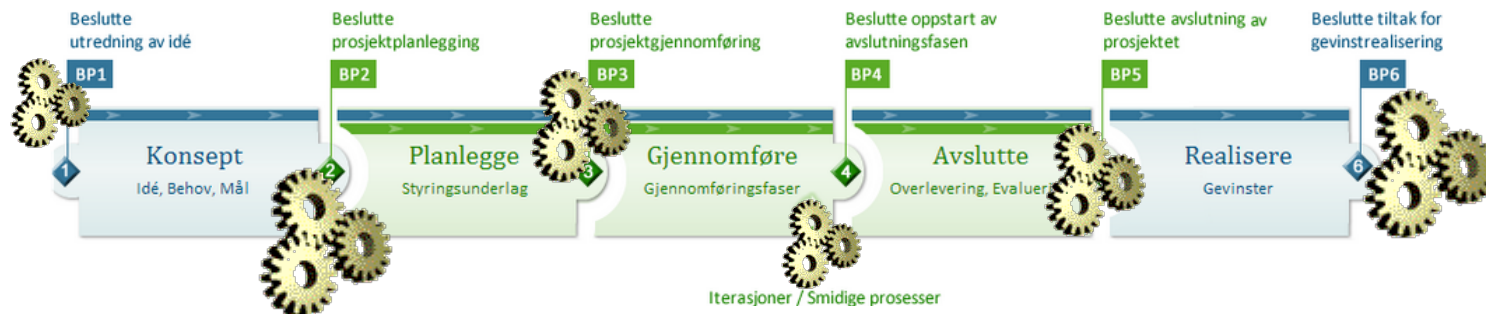


- 2011 - Innfører porteføljestyring som styringsform for implementering av vedtatt **IKT**-strategi
- 2013 - Velger prosjektmodell basert på Prince2/
Prosjektveiviseren 2.0 for **alle kommunens** prosjekter
- 2013 - Lanserer prosjektportal i Sharepoint som prosjektstøtte
Versjon 1.0 = Prosjekt
- 2014 - Samarbeider med mange aktører, private og offentlige om å legge inn verktøy for porteføljestyring
Versjon 2.0 = Prosjekt- og portefølje
- 2015 - Innfører porteføljestyring som styringsform for **rådmannens strategiske prosjekter**

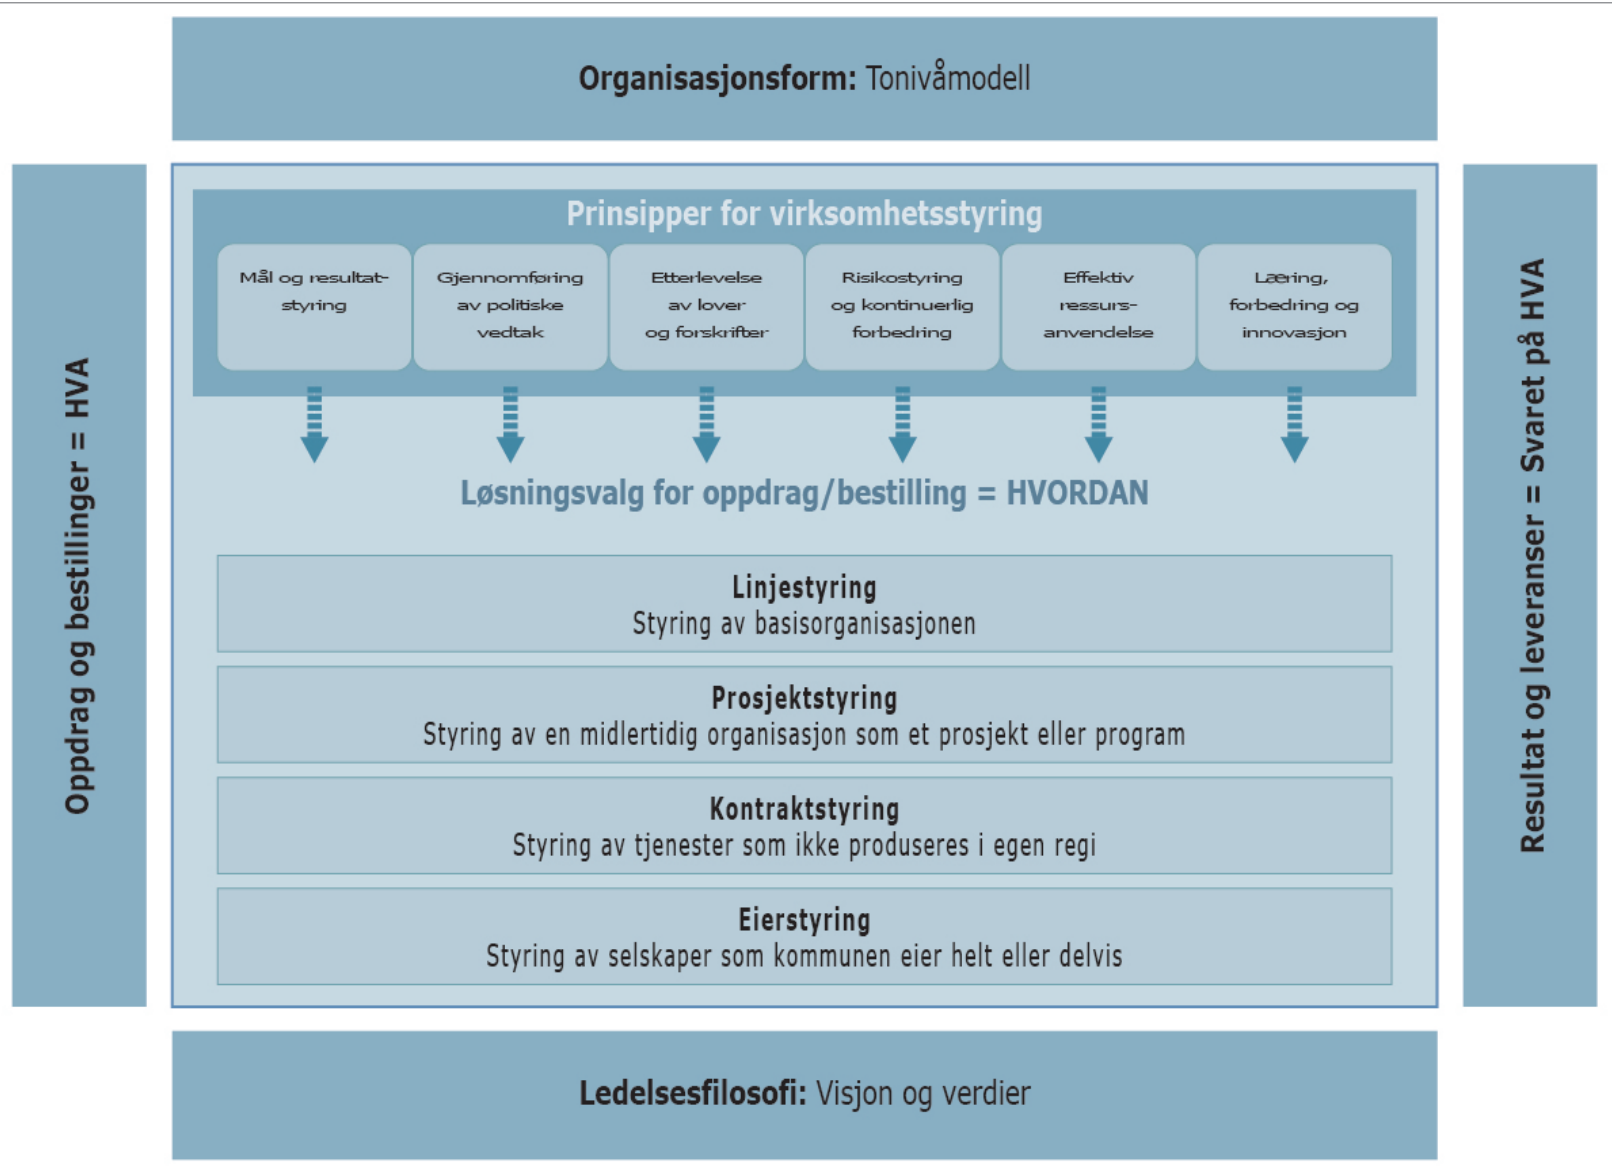

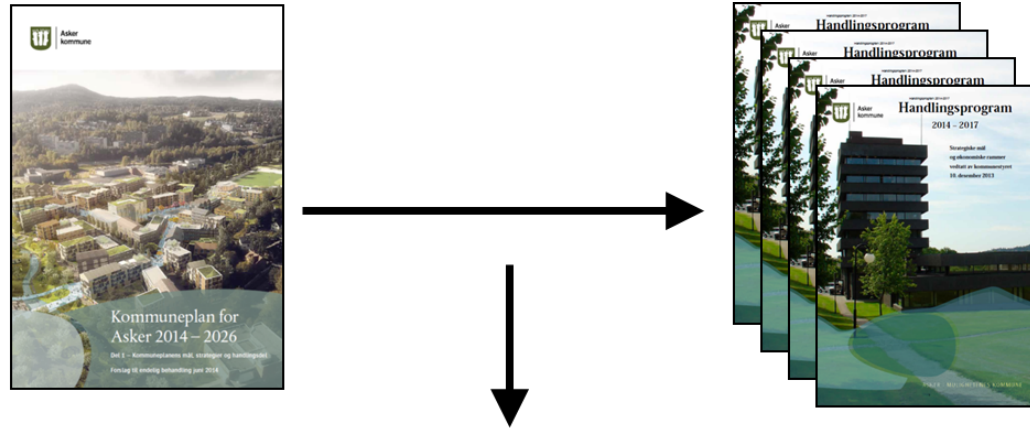

Satsningsområder Kommuneplan 2014-2026	Tverrgående tjenesteutfordringer Løpende handlingsprogram
• Vekst og utvikling • Areal og transport • Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet • Folkehelse • Tettsteder og knutepunkter	• Forebygging og tidlig innsats • God helhet og samhandling • God kvalitet • Nødvendig kompetanse

Strategisk prosjektportefølje







Tabellen nedenfor gir oversikt over kommunens strategiske prosjekter. Disse er politisk vedtatt, har særskilt finansiering, er tjenesteovergripende og er av viss varighet.

Strategisk prosjektportefølje	
Prosjektnavn	Prosjektfase
Områdeutvikling Borgenområdet	Konsept
Folkehelse	Planlegging
Innbyggertorg i Heggedal	Planlegging
Aktiv mot kreft	Gjennomføring
Innovasjonsstrategi	Gjennomføring
Tidlig innsats i Oppvekst	Gjennomføring
BOSO - Boligsosialt handlingsprogram	Gjennomføring
Kunnskapssenteret	Avslutning
BFE - Barne og familieenheten	Realisering

Rådmannen vil i arbeide videre med å utvikle og profesjonalisere prosjekt- og porteføljestyling i kommunen. Det vises til nærmere omtale under fokusområde Læring og fornyelse.

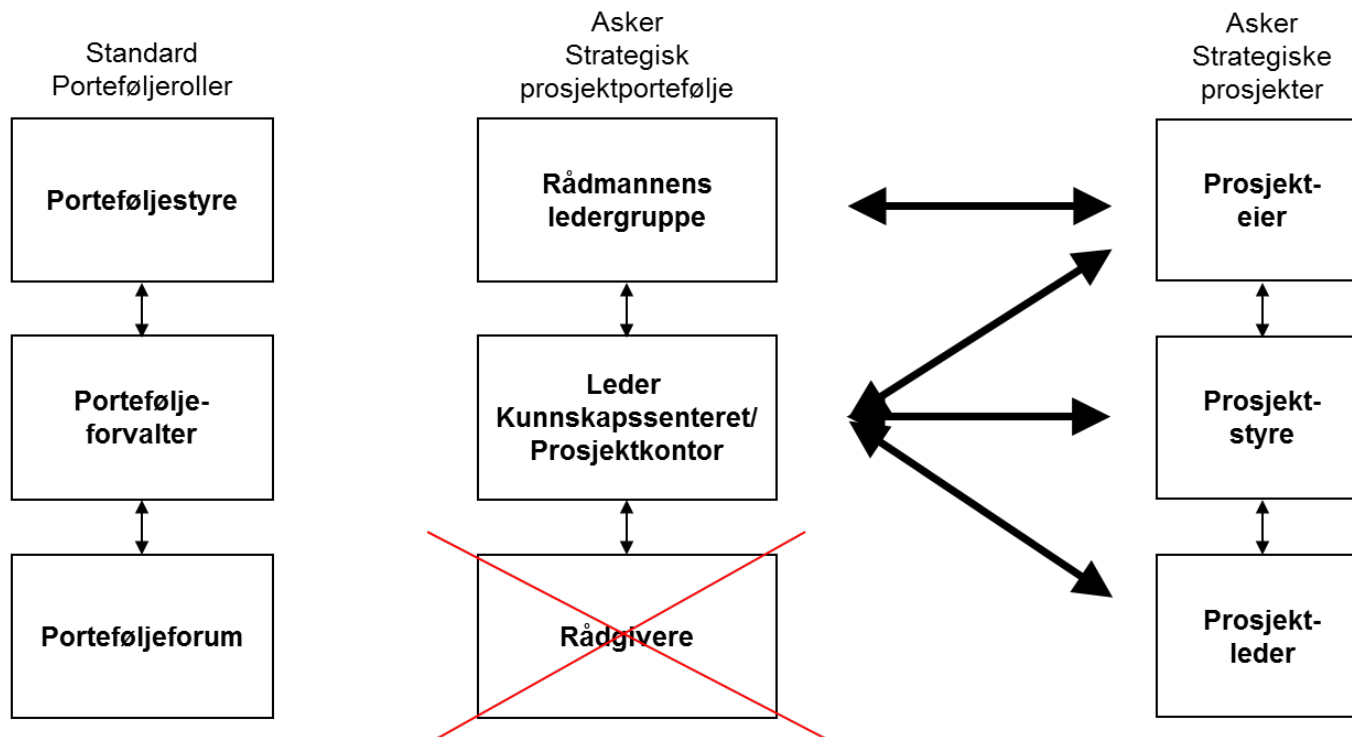

Strategisk prosjektportefølje





- Prosjektverktøy – Ny versjon utarbeides nå, lanseres ??
- Innfasing av de enkelte prosjekt, felles rapportering
- Porteføljestyredager to ganger i året – Årsrapport + 2.tertial

Porteføljeoversikt

Tittel	Effektmål	Prosjekteier	Prosjektleder	Status tid	Status risiko	Status budsjett	Fase	Sist endret
Barnehage 5.0	Bedre barnehage	Geir Graff	Tarjei Ormestøyl	Foran plan	Lav	På budsjett	Planlegge	26. Aug 2014
BFE-prosjektet - Brukerfokustert, Forenklet, Effektiv	Utvikle et bedre samhandlingssystem for Barne- og Familieenheten i Asker kommune, samt en nasjonal felleskomponent for håndtering av samtykke.	Lars Sverre Gjølme	Geir Graff	På plan	Medium	På budsjett	Planlegge	21. Aug 2014
KomINN.no - innovasjonsportalen	Lage en god og inviterende innovasjonsportal for å understøtte systematisk innovasjon i en kommune..	Lars Sverre Gjølme	Geir Graff	På plan	Høy	På budsjett	Planlegge	21. Aug 2014
Ny brannstasjon	Ny brannstasjon	Tarjei Ormestøyl	Ole Kristian Mørch-Storstein	Etter plan	Høy	Vet ikke	Gjennomføre	20. Aug 2014
PRINCE2 Prosjektportal	PRINCE2 Prosjektportal i skyen og on-prem	Geir Graff	Geir Graff	På plan	Lav	På budsjett	Avslutte	20. Aug 2014
testprosjekt 1	beskrivelse av effektmål..	Kirsti Kierulf	Geir Graff	På plan	Høy	På budsjett	Realisere	21. Aug 2014
TEstprosjekt JBV	Bedre et ellerannet..	Aleksander Øines	Geir Graff	På plan	Medium	På budsjett	Planlegge	25. Aug 2014



Asker
kommune

Kravspesifikasjon for leveranse

KS KommIT

KS KommIT



Helsedirektoratet



Asker
kommune

NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET



Arbeidstilsynet



DSS



deler framtiden



statens jernbanetilsyn

jernbane • taubane • park og tivol



HELSE- OG
OMSORGSDEPARTEMENTET



Direktoratet for nødkommunikasjon



Direktoratet for
økonomistyring



- > KommIT, Vestregionen og Asker kommune har sammen finansiert og utviklet prosjektverktøyet i første versjon, gratis tilgjengelig for nedlasting og bruk.



- > Støtter prosjektstyring etter Prosjektveiviseren 2.0, med maler og prosesser.
- > Støtter enkel porteføljeoppfølging basert på automatisk input fra underliggende prosjektområder.



- > Portalløsning basert på SharePoint 2013 Standard edition.
 - Installerbar pakke både for SharePoint Online/Office 365 og selvdrevet, lokal SharePointløsning.
 - Gratis tilgjengelig via GitHub, under GPL2-lisens
(bruk som du ønsker, men gjør du forbedringer i løsningen, må du også dele dem med alle, slik som vi har gjort :)
 - <https://github.com/prosjektstotte/sp-prosjektportal>
